

LUÍS CORREIA/PIAUÍ • 12 A 15 DE JUNHO



“PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA”

REALIZAÇÃO:



Desafios do Controle no Pacto de Retomada das Obras

Keyla Boaventura

Auditora-chefe da AudUrbana/TCU



"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

2,3 milhões de
crianças 0 a 3
anos não
frequentam
creche por
dificuldade de
acesso

20%
2,3 milhões
Não frequentam a
Creche por dificuldade
de acesso

36%
4,2 milhões
Não frequentam a
Creche por opção
dos pais

40%
4,7 milhões
Frequentam
a Creche

3%
0,4 milhão

Não frequentam
a Creche por
outros motivos



Painel do TCU de obras paralisadas

Resumo dos dados selecionados

Filtre os dados de interesse:

Limpar filtros

Data base

- 10/2020
- 08/2022
- 04/2023

Situação

Todos

UF

Todos

Município

Todos

Setor

- Agricultura
- Defesa Civil
- Educação (Hospitais e Inst. Militares)
- Educação básica
- Educação profissional e tecnológica
- Educação superior
- Esporte
- Habitação
- Infraestrutura de Transportes (DNIT)
- Infraestrutura e Mobilidade Urbana
- Outros
- Saneamento
- Saúde

Quantidade de obras

3.580


obras paralisadas

6.161

Total de obras

% de obras paralisadas

Em execução



Paralisada

Valor previsto de investimento

R\$ 3.479.170.204,56

em obras paralisadas

R\$ 7.817.491.969,81

em todas as obras

Recursos federais já investidos

(Em branco)

em obras paralisadas

(Em branco)


em todas as obras

Selecione o modo de visualização dos dados: **Visuais** Tabela

Histórico dos diagnósticos do TCU


Quantidade de obras por situação

● Em execução ● Paralisada

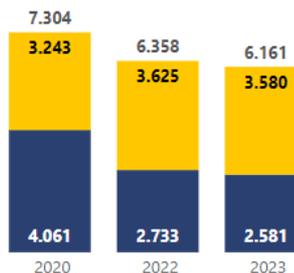


% de obras paralisadas

● Em execução ● Paralisada

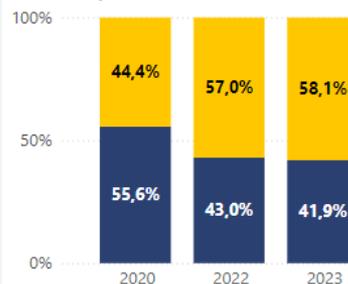

Valor total de investimento previsto

● obras em execução ● obras paralisadas

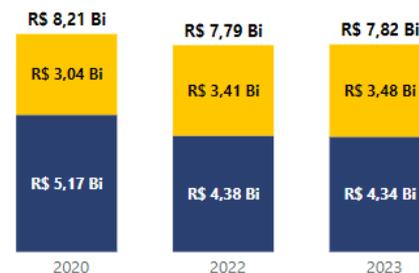

Distribuição das obras paralisadas por estado



ENAOP

2024

"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

Painel do TCU de obras paralisadas

Todos

Município

Todos

Setor

- Agricultura
- Defesa Civil
- Educação (Hospitais e Inst. Militares)
- Educação básica
- Educação profissional e tecnológica
- Educação superior
- Esporte
- Habitação
- Infraestrutura de Transportes (DNIT)
- Infraestrutura e Mobilidade Urbana
- Outros
- Saneamento
- Saúde
- Turismo

Repassador de recursos

Todos

Obra PAC


Todos

Base de dados

Todos


Quantidade de obras por situação

● Em execução ● Paralisada

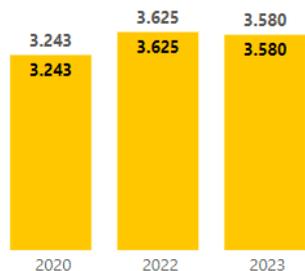


% de obras paralisadas

● Paralisada



Valor total de investimento previsto


● obras em execução ● obras paralisadas

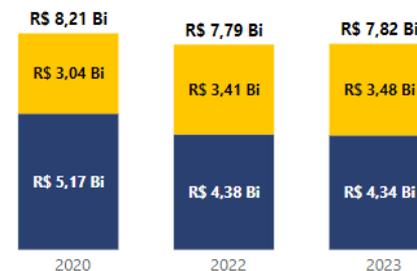

Distribuição das obras paralisadas por estado

Obras paralisadas por UF

qtd %

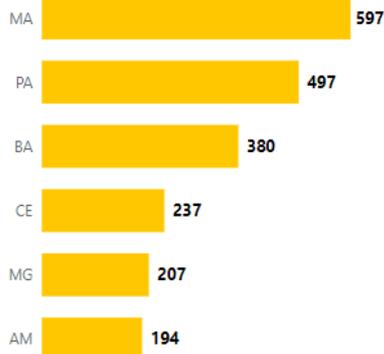

Valor total de investimento em obras paralisadas por UF

● Valor total previsto ● Rec. fed. já investidos



ENAOP

2024

"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

Entra em vigor lei que institui pacto pela retomada de obras inacabadas

Como se trata de programa de repasses voluntários, estados e municípios deverão manifestar interesse na retomada das obras

06/11/2023 - 10:08

DELTA FOLHA

Obras paradas e projetos antigos correspondem a 43% do Novo PAC

Novo pacto deve retomar obras paralisadas nas áreas da saúde e da educação

Ricardo Barretto de Andrade e Mariana Ozaki Marra da Costa

A lei 14.719/23, implementa o Pacto Nacional para Retomada de Obras na educação e saúde. Permite a retomada de obras paralisadas com financiamento do FNDE ou SUS, com prazo de conclusão de até 24 meses, podendo ser prorrogado por mais 24 meses, envolvendo repactuação de financiamento e divulgação online das obras.

terça-feira, 14 de novembro de 2023
Atualizado às 14:18

Ministério da Saúde vai retomar mais de 6,3 mil obras paradas para ampliar acesso ao SUS em todo Brasil

Entre as obras paralisadas nos últimos anos, estão Unidades Básicas de Saúde, Centros de Reabilitação e Unidades de Pronto Atendimento. Investimento pode chegar a R\$ 3,7 bilhões

Publicado em 18/01/2024 14h49

Compartilhe: [f](#) [x](#) [in](#) [wh](#) [link](#)



2024

"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

LEI 14.719/2023

Institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica e Profissionalizante e à Saúde

Art. 10. As obras e os serviços de engenharia paralisados ou inacabados de que trata esta Lei poderão ser retomados com a utilização de recursos exclusivamente oriundos dos orçamentos municipais, estaduais ou distritais.

Parágrafo único. Para atender ao disposto no **caput** deste artigo, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão utilizar recursos recebidos na modalidade transferência especial de que trata o [art. 166-A da Constituição Federal](#).



Grandes números do Pacto de Retomada de Obras do FNDE

5.642 Obras paralisadas ou inacabadas para serem retomadas;

3.783 Obras que os entes manifestaram interesse em repactuar (67%);

2.406 municípios

1.104.734 potencial de novas vagas na rede pública de ensino;

R\$ 3,8 bilhões é o investimento total estimado;

R\$ 1 milhão é o investimento médio para a conclusão das obras;

24 meses é o prazo para conclusão das obras (prorrogável 1x pelo mesmo prazo)

Aportes de recursos financeiros: federal, estaduais e municipais.



"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

Fases do Pacto de Retomada de Obras do FNDE

Fase 1
Manifestação de
Interesse

Fase 2
Diligência inicial do
FNDE

Fase 3
Ajustando a rota.
Diligências
adicionais

Fase 4
Vamos repactuar

Fase 5
Compromisso
assumido e
comprovado!

Fase 6
Um caminho
conhecido: a
execução da obra

Fase 7
Conclusão da obra
e entrega à
sociedade




ENAOP

2024

"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

Quantidade de obras que cada ente pode repactuar

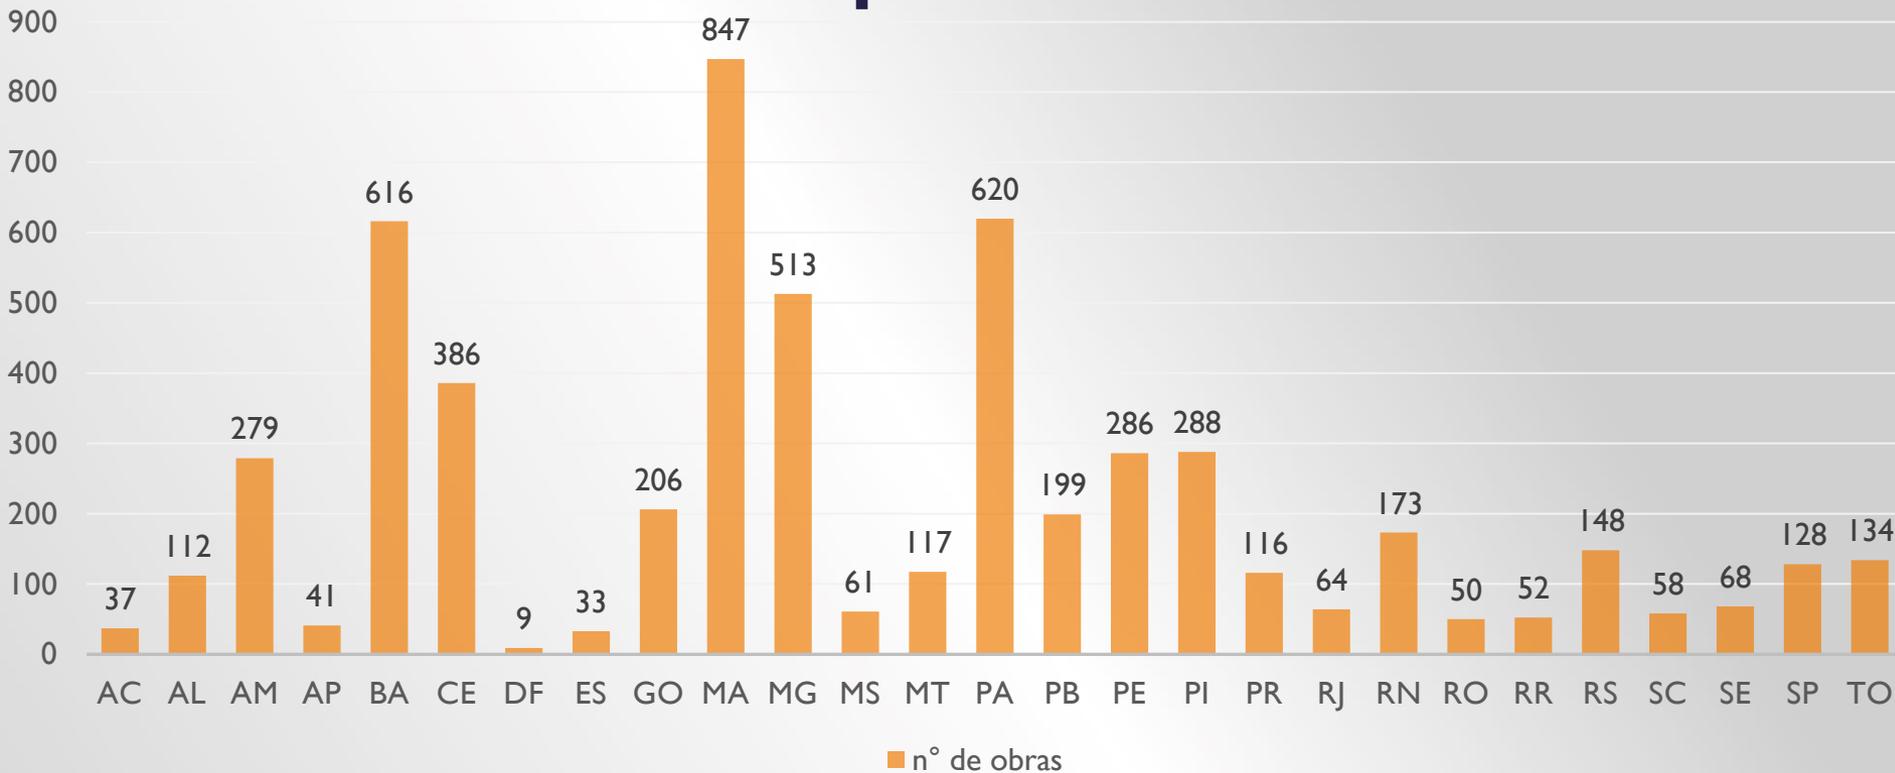

Os estados da federação com maior número de obras passíveis de serem repactuadas são: Maranhão (847), Pará (620) e Bahia (616). Juntos, esses estados correspondem a 36,93% das obras que podem aderir ao Pacto.



"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"



Obra de creche largada na zona rural de Vigia, no interior do Pará
Imagem: Símeo/FNDE

Os maiores custos estimados para repactuação são dos estados:

Maranhão: R\$ 882.878.305,30,

Bahia: R\$ 657.713.886,80 e,

Pará: R\$ 525.918.164,83.



ENAOP

2024

"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

Novas regras

- ✓ A atualização dos valores acordados anteriormente, levando em consideração o Índice Nacional do Custo da Construção (INCC)

OBRAS COM INSTRUMENTO PACTUADO EM	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC) ACUMULADO NO PERÍODO
2007	206,51%
2008	188,40%
2009	158,29%
2010	149,17%
2011	131,92%
2012	114,70%
2013	100,31%
2014	85,40%
2015	73,32%
2016	61,72%
2017	52,21%
2018	46,91%
2019	41,29%
2020	35,50%
2021	22,00%
2022	8,97%

Fonte: Anexo da Lei 14.719/2023

Essa atualização vai de **8,97%** para obras de 2022 até **206,51%** para obras de 2007, conforme indica o anexo da Lei 14.719/2023.



"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

COMO FUNCIONA A CORREÇÃO DOS VALORES?

O reajuste será aplicado aos saldos que ainda devem ser transferidos, após comprovação da execução física da obra e aprovação técnica pelo FNDE.

Ex:

- Uma **creche** foi iniciada em **2007** com pactuação original de **R\$ 1 milhão**
- Município já recebeu R\$ 400 mil

Poderá receber o saldo de R\$ 600 mil, com correção de até 206,51%* =
+ 1.8 MILHÃO**

A regulamentação do Pacto permite ao FNDE restituir o ente federado os recursos próprios aplicados para concluir as obras

Art. 6º As repactuações de valores de que tratam os arts. 4º e 5º observarão os limites percentuais estabelecidos no Anexo desta Lei, aplicados sobre o valor correspondente à fração não executada da obra ou do serviço de engenharia, de acordo com as informações contidas no sistema informatizado de acompanhamento.

(...)

§ 4º Os entes federativos que concluírem as obras com recursos próprios poderão requerer ao FNDE o ressarcimento da verba anteriormente pactuada e pendente de repasse na data de publicação desta Lei.



Acompanhamento do Pacto de Retomada das Obras do FNDE pelo TCU

Objetivo:

- ✓ Conhecer as regras do Pacto;
- ✓ Levantar os riscos envolvidos;
- ✓ Elaborar estratégia de atuação do TCU em conjunto com os demais Tribunais de Contas do Brasil;
- ✓ Elaborar Plano de Trabalho para acompanhar a implementação do Pacto.



ACOM do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica e Profissionalizante

Achados:

- **insuficiência na demonstração e detalhamento, pelo FNDE, da previsão dos recursos orçamentários e financeiros destinados ao financiamento das obras do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica;**
- Registrou, ainda, que há **baixo nível de transparência ativa dos dados do Pacto**, notadamente no que diz respeito a incompletude das informações necessárias à boa execução de todos os marcos previstos.



"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

Acordo de cooperação técnica

- **PARÁGRAFO PRIMEIRO.** No caso de ações federais que envolvam a realização de obras, o TCU atuará, preferencialmente, no controle das ações a cargo do Governo Federal como, por exemplo, a definição da estratégia do programa e dos critérios gerais de priorização, e os demais TCs atuarão, preferencialmente, no controle das ações a cargo da administração estadual e municipal como, por exemplo, a licitação e a execução das obras.
- **PARÁGRAFO SEGUNDO.** A definição das diretrizes e procedimentos para fiscalizações com competência concorrente ocorrerá por meio de plano de trabalho, delimitando o escopo da ação governamental a ser controlada de forma coordenada.
- **PARÁGRAFO TERCEIRO.** Será disponibilizada ferramenta informatizada, com a finalidade de compartilhar dados sobre as fiscalizações de obras em que haja competência concorrente e os respectivos resultados.



"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

Acompanhamento do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica

 **Início:** 2024

Tipo: Informações

 **Estágio:** Em andamento

Objetivo: Necessidade de articulação para evitar duplicidade de esforços entre o TCU e os Tribunais de Contas para acompanhar o Pacto e os contratos da retomada das obras do FNDE.

Acompanhamento do Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica

36 participante(s)

Alcimar Alves Fraga	TCE-PB	Alfredo Cesar Montezuma Batista Belo	TCE-PE	Hermes Fradique Marçal	TCM-GO	Jesce John da Silva Borges	TCE-PE
Andreza Pereira Santa Brigida Pampolha	TCM-PA	Bruno Luis Malaquias e Silva	TCE-GO	Jhon Deivison Santos Campos	TCE-AL	Júlio Uchoa Cavalcanti Neto	TCE-PB
Brynnner Barbosa de Brito	TCE-PA	Carlos Eduardo de Moura	TCE-PR	Leonardo Gonçalves da Costa	TCE-RO	Lucas Eulálio Carvalho	TCE-PI
Carlos José Pacheco Caron	TCE-PR	Danilo Oliani	TCE-SC	Luciano Coelho	TCU	Márcio Antônio Braga de Sousa	TCM-RJ
Davi Assunção Salvador Nery De Castro	TCDF	Dênis Luciano Pereira Araújo	TCE-TO	Maria Jose Herkenhoff Carvalho	TCE-PR	Mary Karla Maia dos Santos	TCE-SE
Diviaci Junior	TCE-MA	Douglas Emanuel Nascimento de Oliveira	TCE-MG	Matheus Lapolli Brighenti	TCE-SC	Maurício Ferreira da Costa	TCM-RJ
Euderiques Pereira Marques	TCE-AM	Felipe Castro Garcia	TCE-PR	Paulo Augusto Daschevi	TCE-PR	Pedro Coelho Teixeira Cavalcanti	TCE-PE
Felipe Freire Monteiro	TCE-PA	Fernando Daniel Insaurralde	TCE-MS	Rafael Leão Wanzeler	TCM-PA	Raphael Nunes	TCU
Fernando Junqueira Bordignon	TCE-RO	Guilherme Vinicius Scheeren	TCE-AL	Ricardo Souza Lobo	TCE-GO	Ronaldo Almeida de Lima	TCE-AM





Painel do FNDE



Pacto de Retomada de Obras

Situação das Obras

Obras enquadradas na Retomada	Manifestações de Interesse	Obras que Não Aderiram	Em Processo de Retomada	Obras Aprovadas	Em Processo de Cancelamento
5.642	3.783	1.859	3.532	205	1.905

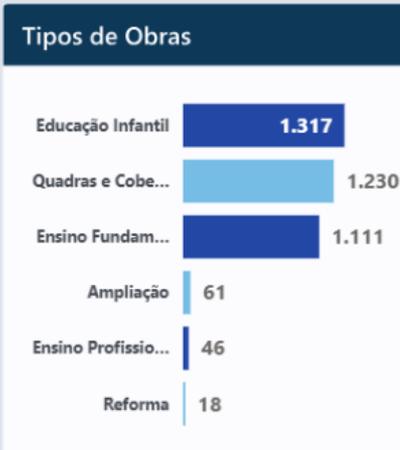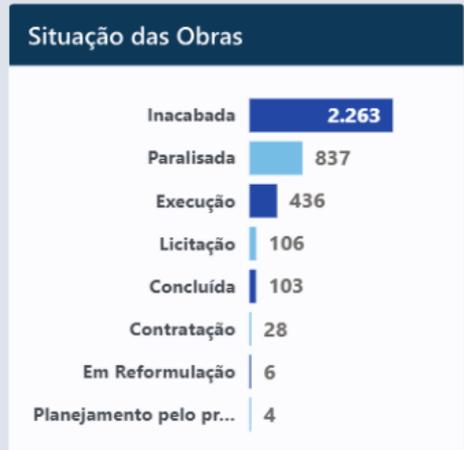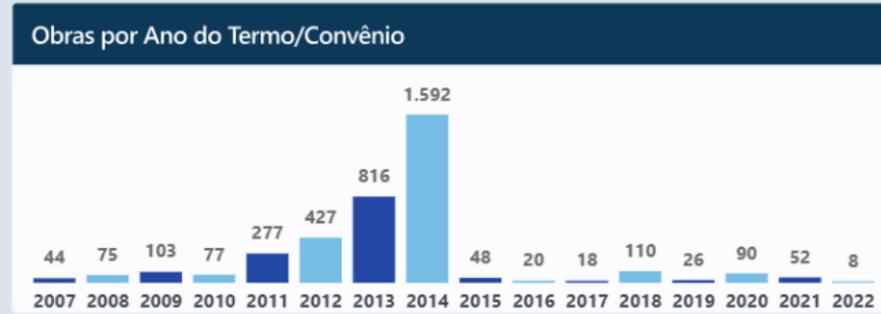

Pacto de Retomada de Obras | FNDE | MEC - 06/06/2024

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDQ3YWI5ZWItNTNiZi00Y2ZjLTkyNTAtMDBhZGE1OGU4NTQ0IiwidCI6ImNmODQ1NGQzLUWUwMTItNGE5ZC05NWlzLTcwYmRiNmY0NTlkNSJ9>

ENAOP

2024

"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

Detalhamento da Situação das Obras Aprovadas


ID	Esfera	UF	Município	Situação da Obra	Tipo de Obra	Tipologia	Situação da Solicitação	Quant. Análise	Data última tramitação	Termo
1109649	Municipal	AM	Tabatinga	Paralisada	Quadras e Cobertura de Quadras	Quadra Escolar Coberta e Vestiário - Modelo 2	Deferido	3	10/05/2024	
1107087	Municipal	CE	Campos Sales	Inacabada	Quadras e Cobertura de Quadras	Quadra Escolar Coberta e Vestiário - Modelo 2	Deferido	5	09/05/2024	🔗
1104280	Municipal	CE	Aiuaba	Paralisada	Ensino Fundamental	Escola 06 Salas com Quadra - Projeto FNDE	Deferido	4	21/05/2024	
1103429	Municipal	CE	Aiuaba	Paralisada	Ensino Fundamental	Espaço Educativo - 12 Salas	Deferido	3	17/05/2024	
1103023	Municipal	CE	Senador Pompeu	Inacabada	Ensino Fundamental	Espaço Educativo - 12 Salas	Deferido	3	06/05/2024	🔗
1102575	Municipal	MA	Miranda do Norte	Execução	Ensino Fundamental	Espaço Educativo - 12 Salas	Deferido	3	21/05/2024	
1102137	Municipal	AM	Fonte Boa	Licitação	Ensino Fundamental	Escola 04 Salas com Quadra - Projeto FNDE	Deferido	3	19/04/2024	🔗
1101831	Municipal	PA	Pau D Arco	Paralisada	Educação Infantil	Projeto 2 Convencional	Deferido	4	07/05/2024	
1101654	Municipal	BA	Euclides da Cunha	Inacabada	Educação Infantil	Projeto 1 Convencional	Deferido	3	16/04/2024	🔗
1097735	Municipal	BA	Boa Vista do Tupim	Paralisada	Ensino Fundamental	Espaço Educativo - 12 Salas	Deferido	3	16/05/2024	
1097410	Municipal	MA	Sítio Novo	Planejamento pelo proponente	Ensino Fundamental	Espaço Educativo - 12 Salas	Deferido	2	19/04/2024	🔗

Pacto de Retomada de Obras | FNDE | MEC - 09/06/2024

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDQ3YWl5ZWItNTNiZi00Y2ZjLTkyNTAtMDBhZGE1OGU4NTQ0IiwidCI6ImNmODQ1NGQzLWUwMTItNGE5ZC05NWl5LTcwYmRiNmY0NTlkNSJ9>


ENAOP
2024
"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

Total de obras cujos entes se manifestaram pela repactuação (por tipo)

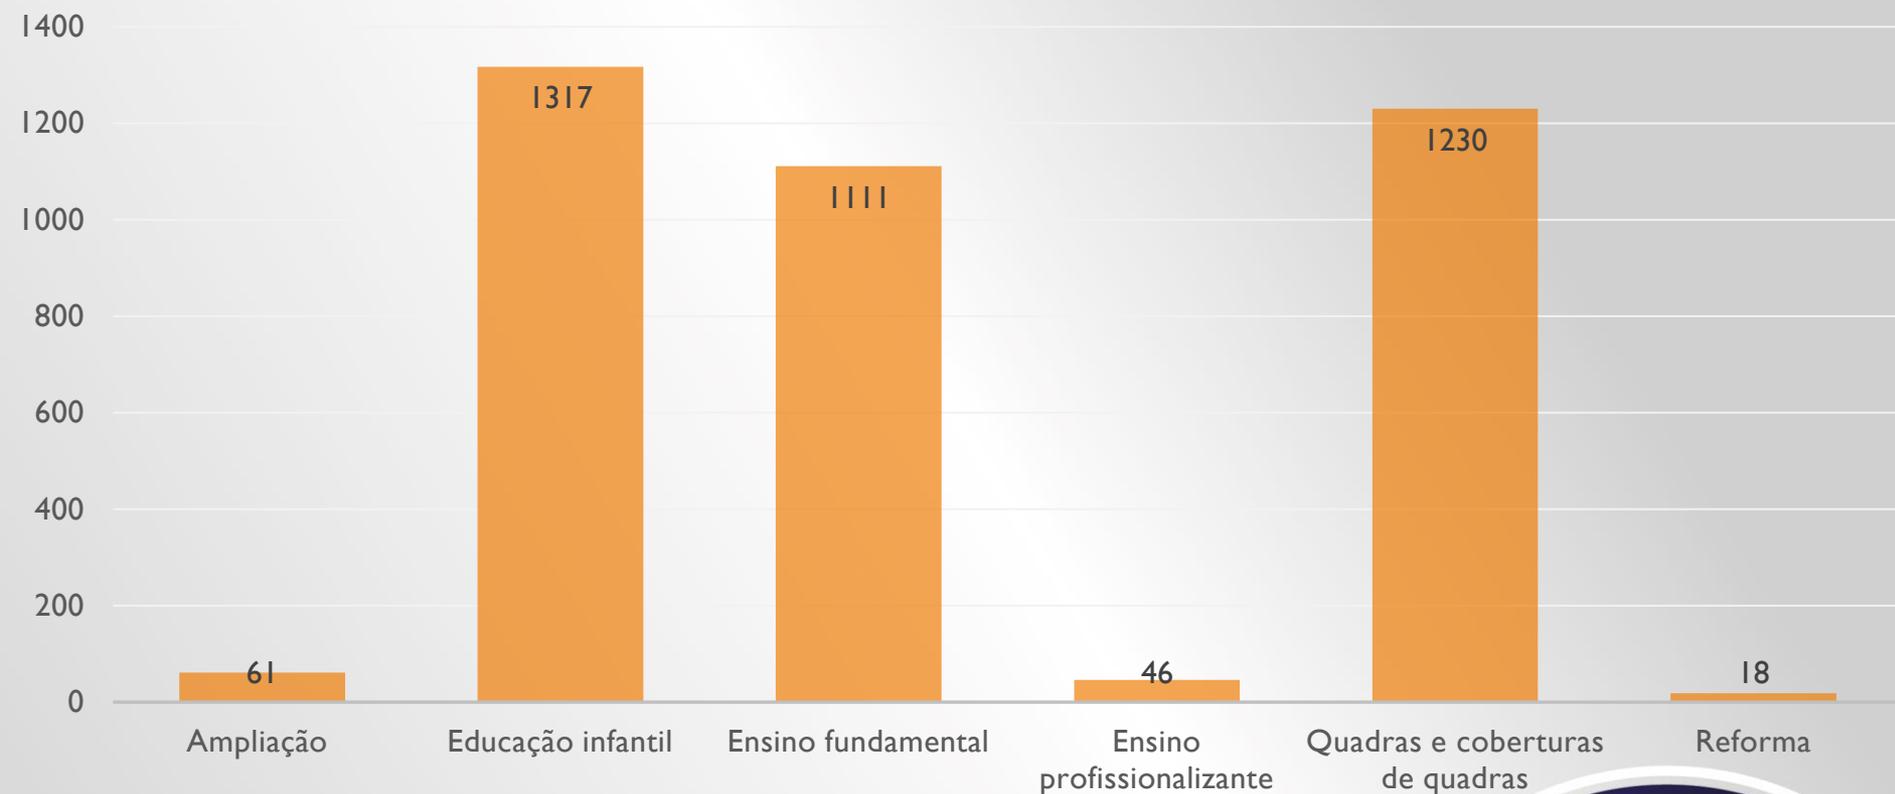


Fonte: <https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/par/pacto-nacional-pela-retomada-de-obras-da-educacao>



"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

Situação da análise documental do Pacto - SIMEC em 6/6/24

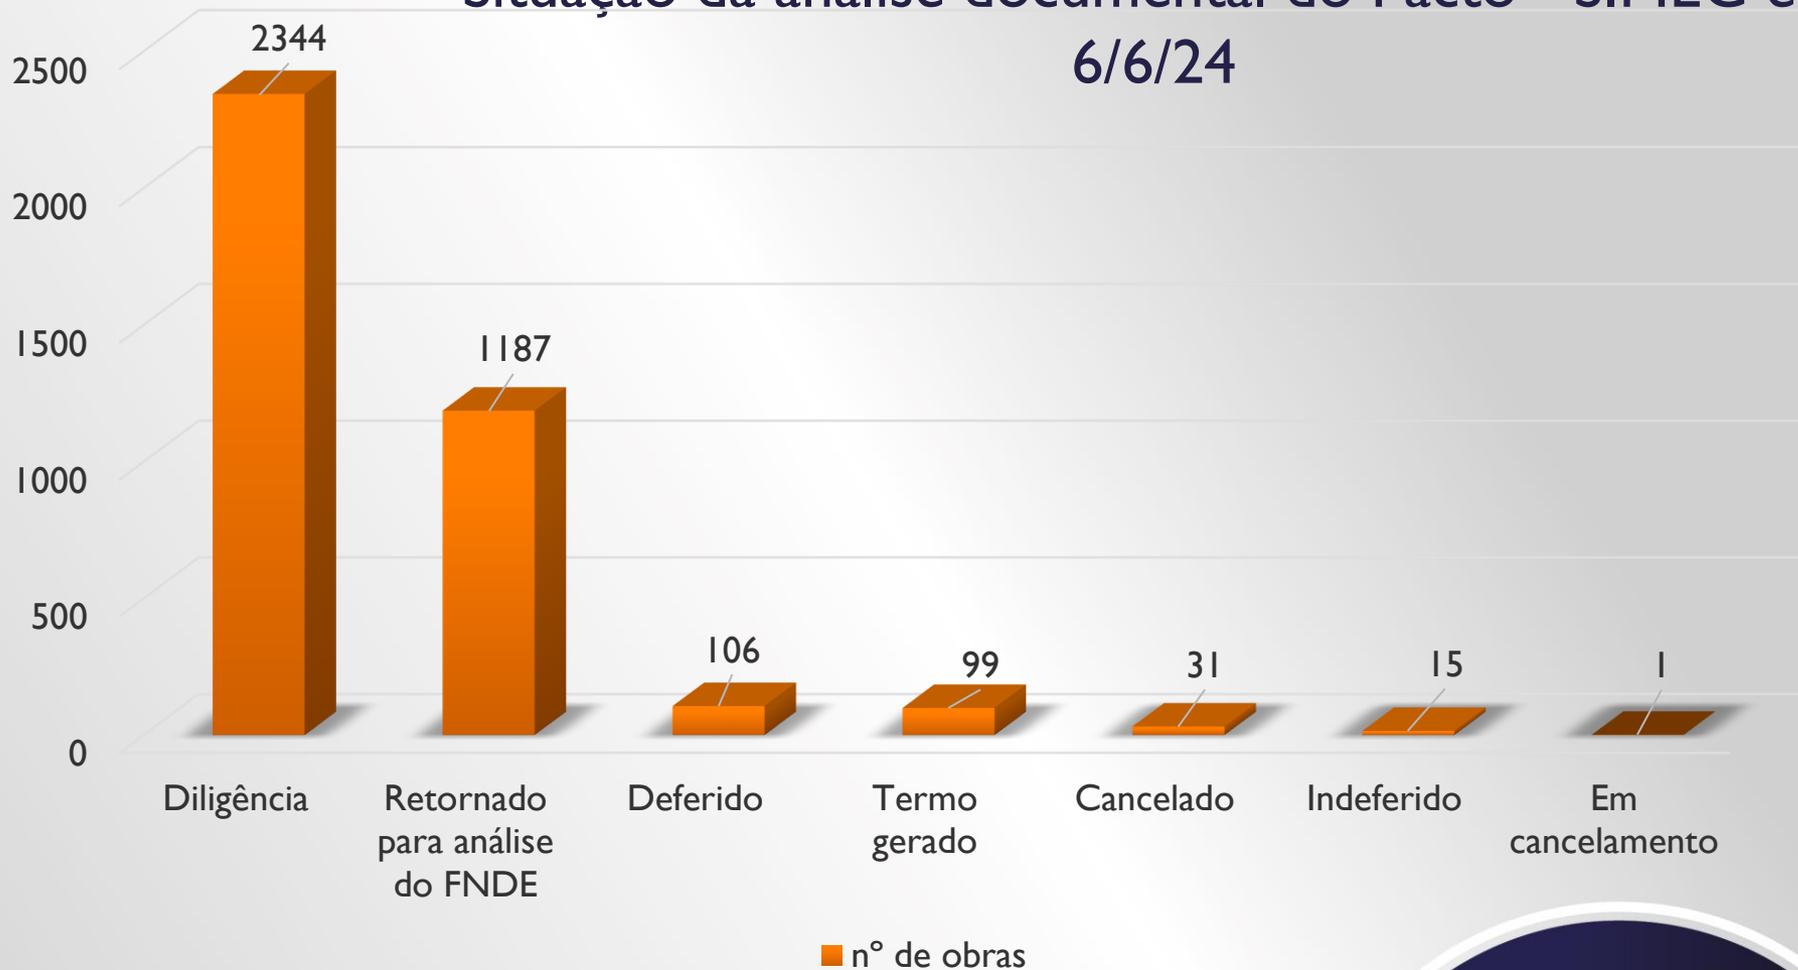

ENAOP

2024


"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

Acompanhamento Prioritário das Diligências

Obras em Diligência	Quantidade Análise das Obras	Diligências para 28 Junho
2.326	4.897	527



Foco por UF e Prazo para Resposta à 1ª Diligência

● 1º diligência inicial ● Demais diligências

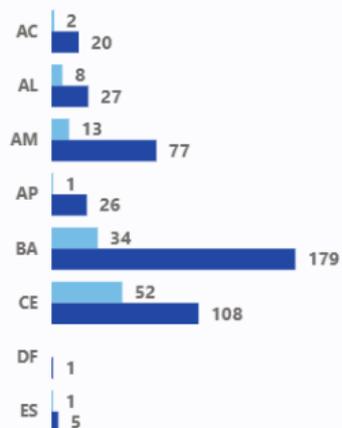
Situação das Obras





Foco por Prazo para Resposta à 1ª Diligência

● Demais diligências ● 1º diligência inicial

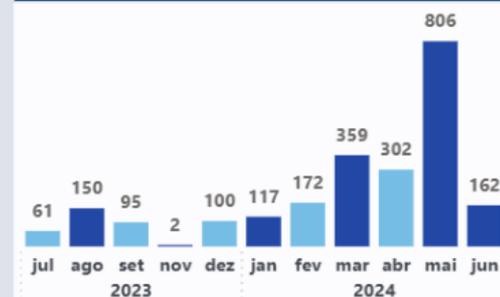
Data da Última Tramitação

ENAOP

2024

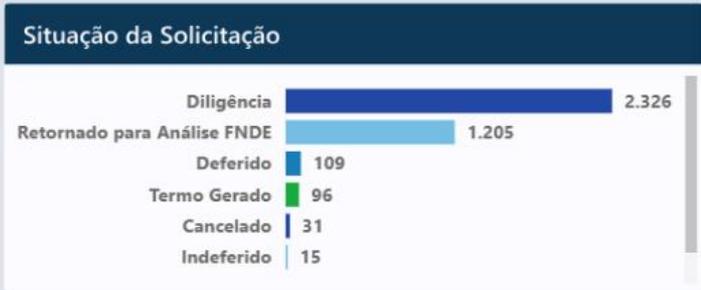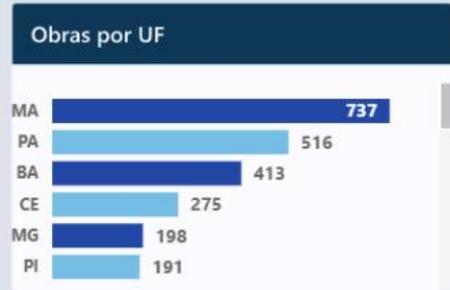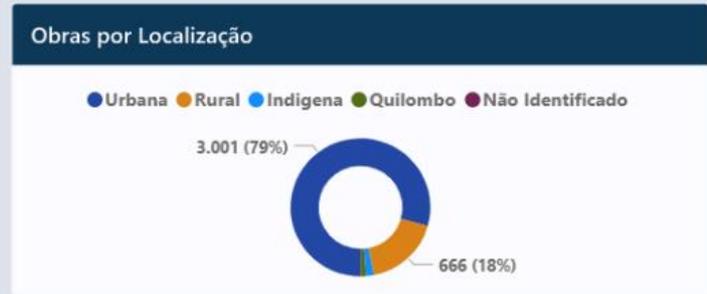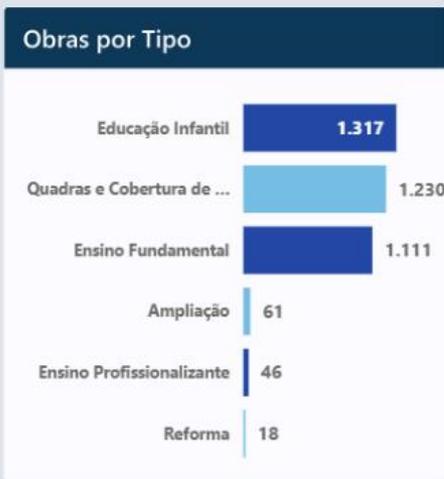"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"

Visão Geográfica


<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDQ3YWI5ZWItNTNiZi00Y2ZjLTkyNTAtMDBhZGE1OGU4NTQ0IiwidCI6ImNmODQ1NGQzLWUwMTItNGE5ZC05NWlZLTcwYmRiNmY0NTlkNSJ9>



Planilha com a lista das obras paralisadas e inacabadas do Pacto

B20 : X X f x Manifestaram Adesão à MP. 1.174

ID	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
	UF	Motivo da adesão	Nº Processo	Termo/Nº Convênio	Ano Termo/Início	Município	UC	Situação da Obra	% Executado	Última Vistoria	Programa	Fonte	Esfera	Tipologia	Tipo de Obra	Nº alunos (2 turnos)	Nº Alunos (Integral)	Valores FNDE	Valores Pacto
1380	PI	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400003153200834	70037	2008	Novo Oriente do Piauí	PI	da - PC Técnica C4	100,00%	06/10/2016	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 940.498,30	R\$ 940.498,30
1381	PI	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400005232200744	700080	2008	Debras	PI	Inacabada	72,30%	14/11/2016	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 1.124.657,01	R\$ 423,69
1432	TO	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400002632200738	830103	2007	Formoso do Araguaia	TO	Inacabada	89,31%	23/11/2015	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 960.021,36	R\$ 960,02
1458	TO	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400007193200796	830330	2007	Paraisópolis do Tocantins	TO	da - PC Técnica C4	11,72%	30/08/2011	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 700.000,00	R\$ 700,00
1516	SP	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400004435200705	710244	2008	espírito Santo do Turu	SP	Execução	95,22%	24/11/2023	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Projeto 1 Convencional	Educação Infantil	376	188	R\$ 1.884.402,01	R\$ 700,00
1537	MG	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	2340000522320073	710277	2008	Guaraciama	MG	Inacabada	60,88%	11/03/2015	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 1.041.689,09	R\$ 1.041,66
1577	GO	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400007622200793	710026	2008	Guaraitá	GO	da - PC Técnica C4	100,00%	16/02/2016	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 950.000,00	R\$ 950,00
1604	PI	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400002762200716	700098	2008	Anísio de Abreu	PI	da - PC Técnica C4	88,67%	06/08/2019	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 940.498,31	R\$ 940,49
1605	MG	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400005236200771	710002	2008	Coração de Jesus	MG	da - PC Técnica C4	48,12%		PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 950.831,00	R\$ 950,83
1606	TO	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400003236200796	830431	2007	Sampaio	TO	da - PC Técnica C4	100,00%	03/07/2014	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo C	Educação Infantil	60	60	R\$ 950.000,00	R\$ 950,00
1610	BA	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400003579320071	700075	2008	Vanderley	BA	da - PC Técnica C4	66,38%	08/04/2016	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 1.267.331,78	R\$ 1.267,33
1635	BA	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	2340000523200733	710010	2008	Águas Vermelhas	BA	da - PC Técnica C4	71,22%		PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 1.237.664,04	R\$ 1.237,66
1640	RJ	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400003079200706	830117	2007	Belford Roxo	RJ	da - PC Técnica C4	4,33%	19/10/2012	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 700.000,00	R\$ 700,00
1640	MA	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	2340000932200815	700114	2008	Grajaú	MA	Concluída	100,00%	14/08/2023	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 1.032.169,09	R\$ 940,50
1656	MG	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	2340000169320071	710212	2008	Piracanjuba	MG	da - PC Técnica C4	53,37%	06/07/2016	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 950.000,00	R\$ 700,00
1661	GO	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400002770200764	830003	2007	Buritizeiro	GO	da - PC Técnica C4	58,29%	28/09/2015	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 1.040.723,19	R\$ 1.040,72
1678	PI	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400003353200843	700050	2008	São Romão	PI	Inacabada	74,18%	28/12/2015	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 1.319.646,05	R\$ 1.319,64
1682	PI	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400004181200803	700018	2008	Riachão	PI	Paralisada	35,68%	01/06/2023	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 1.041.663,09	R\$ 700,00
1711	RS	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400007484200796	710394	2008	São José do Norte	RS	da - PC Técnica C4	4,10%	16/01/2014	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 950.000,00	R\$ 700,00
1838	SC	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	2340000126200760	830069	2007	Munizinga do Sul	SC	Inacabada	87,60%	05/11/2015	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 940.500,00	R\$ 340,50
1867	GO	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400004239200726	830473	2007	Campinote	GO	da - PC Técnica C4	72,89%	13/04/2015	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 950.000,00	R\$ 950,00
1870	MG	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400004159200753	710240	2008	Itapiraçu Paulista	MG	da - PC Técnica C4	84,33%	08/12/2015	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 940.683,48	R\$ 940,68
1897	SP	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400002181200786	830409	2007	Novais	SP	da - PC Técnica C4	49,44%	04/03/2015	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 950.000,00	R\$ 950,00
2001	MT	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400004354200705	152182	2020	Glória D'Oeste	MT	Inacabada	83,28%		PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 1.032.169,09	R\$ 1.032,16
2035	MG	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	2340000369200715	710145	2008	Muzambinho	MG	Inacabada	99,32%	23/11/2022	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 1.280.296,61	R\$ 1.280,29
2059	PI	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	2340000425200796	830241	2007	Itó	CE	Inacabada	44,28%	15/07/2014	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 1.050.229,19	R\$ 1.020,00
2061	MG	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400001084200778	830045	2007	Francisco Sá	MG	da - PC Técnica C4	85,12%	17/12/2015	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 950.000,00	R\$ 950,00
2068	MG	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400002513200723	710255	2008	Araguariama	TO	da - PC Técnica C4	75,75%	28/07/2015	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 940.500,00	R\$ 940,50
2072	MG	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400004631200774	710159	2008	Capim Branco	MG	da - PC Técnica C4	100,00%	16/05/2014	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 950.000,00	R\$ 950,00
2087	RN	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	2340000432200714	710126	2008	Lajes	RN	da - PC Técnica C4	88,98%	04/01/2016	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 1.118.438,64	R\$ 1.118,43
2088	PI	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	2340001060200970	700055	2008	Condado	PB	Inacabada	75,17%	30/08/2014	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 940.500,00	R\$ 940,50
2095	MG	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400003086200708	830033	2007	Unimim	CE	da - PC Técnica C4	73,46%	25/10/2016	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 1.050.229,19	R\$ 1.050,22
2107	MA	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400000913200884	700019	2008	Sítio Novo	MA	da - PC Técnica C4	71,80%	11/02/2015	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 1.089.169,09	R\$ 1.089,16
2136	RN	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400007811200771	710246	2008	Serrinha	RN	da - PC Técnica C4	52,39%	30/07/2014	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 700.000,00	R\$ 700,00
2149	PI	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400004432200716	710085	2008	Planalto da Serra	MT	da - PC Técnica C4	84,73%	16/11/2015	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 940.500,00	R\$ 940,50
2178	PB	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400002024200771	830450	2007	Catingueira	PB	da - PC Técnica C4	22,01%	14/12/2011	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 700.000,00	R\$ 700,00
2182	CE	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400003510200714	830187	2007	Pacujá	CE	Inacabada	27,18%	25/10/2012	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 700.000,00	R\$ 700,00
2207	CE	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	2340000354020080	700111	2008	Jaguaretama	CE	da - PC Técnica C4	16,52%	28/10/2012	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 700.000,00	R\$ 700,00
2232	MG	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400003779200873	700043	2008	Diquea Arcoverde	PI	da - PC Técnica C4	10,68%	30/03/2014	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 1.415.401,98	R\$ 700,00
2241	MG	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400000912200783	830294	2007	Santo Hipólito	MG	da - PC Técnica C4	6,28%	30/08/2011	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 700.000,00	R\$ 700,00
3576	TO	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	2340000235320080	700144	2008	vinópolis do Tocantins	TO	Inacabada	84,88%	01/04/2015	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 1.260.844,44	R\$ 940,50
3770	PE	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400004216200801	700193	2008	Iati	PE	da - PC Técnica C4	62,49%	01/04/2019	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 940.500,00	R\$ 940,50
3805	TO	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400002351200811	700201	2008	Riachinho	TO	Inacabada	41,48%	11/05/2015	PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 1.317.127,78	R\$ 705,37
3810	RN	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400000874200816	700243	2008	Marcelino Vieira	RN	Inacabada	77,40%		PROINFÂNCIA	CONVENIO	Municipal	Escola de Educação Infantil Tipo B	Educação Infantil	224	112	R\$ 940.500,00	R\$ 940,50
5274	BA	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400005506200868	750011	2008	Maragogipe	BA	Paralisada	27,60%	14/07/2023	Brasil Profissionalizado	CONVENIO	Estadual	Ampliação	Ampliação	0	0	R\$ 642.701,25	R\$ 642,70
5288	BA	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	2340000590200868	750011	2008	Conceição do Coité	BA	Licitação	77,54%		Brasil Profissionalizado	EMENDAS	Estadual	Ampliação	Ensino Profissionalizante	360	180	R\$ 642.701,25	R\$ 642,70
5318	BA	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400008368200806	750015	2008	Guaraguauera	BA	Execução	97,88%	24/11/2023	Brasil Profissionalizado	CONVENIO	Estadual	Ampliação	Ensino Profissionalizante	360	180	R\$ 1.684.106,39	R\$ 1.684,10
5353	BA	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400005906200868	750011	2008	Morro do Chapéu	BA	Execução	83,06%	05/07/2023	Brasil Profissionalizado	EMENDAS	Estadual	Ampliação	Ensino Profissionalizante	360	180	R\$ 642.701,25	R\$ 642,70
5399	RN	Manifestaram Adesão à MP. 1.174	23400000655200853	700214	2008	Natal	RN	Paralisada	93,78%	04/12/2023	Brasil Profissionalizado	CONVENIO	Estadual	Ampliação	Ampliação	0	0	R\$ 686.973,34	R\$ 686,97
5403	PA	Manifestaram																	

Retomada de Obras da Educação: prazo para regularizar documentação é prorrogado

Gestores têm até o dia 28 de junho para resolver pendências

Publicado em 03/06/2024 12h10

Compartilhe: [f](#) [X](#) [@](#)



O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) prorrogou até 28 de junho de 2024 o prazo para que gestores que aderiram ao Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica respondam às pendências de documentações. A medida visa dar mais tempo para que os entes federativos regularizem a documentação necessária para a conclusão das obras. Cerca de 750 obras em todo o país correm o risco de serem canceladas caso o prazo não seja cumprido.

A presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba, destaca a importância de aproveitar essa prorrogação. "Entendemos que os gestores enfrentam desafios; esta prorrogação é uma oportunidade para garantir a conclusão dessas obras tão necessárias para o desenvolvimento educacional do nosso país. Mesmo que não consigam enviar todos os documentos solicitados nas diligências, é essencial enviar o que for possível. Nossa equipe está à disposição para apoiar e auxiliar em todas as etapas do processo", afirma.

O TCU tem evidenciado a baixa capacidade institucional dos municípios

Durante o diagnóstico das obras paralisadas, foram observados diversos problemas, como atraso no início de execução da obra, projeto básico deficiente, má fiscalização da obra ou, ainda, demora na resolução de pendências necessárias para continuação do empreendimento.

Existe assimetria entre a capacidade técnica dos municípios brasileiros para a elaboração de projetos e execução dos recursos de investimento alocados pelo governo federal. Não seria prudente aprovar apenas os convenientes que possuem capacidade técnica suficiente para receber recursos, sob o risco de aumentar a desigualdade entre os municípios.

Acórdão 1079/2019-P

Recomendar ao Ministério Economia que aprimore os critérios de avaliação da capacidade técnica dos entes tomadores, utilizando critérios de aferição objetivos e compatíveis com a complexidade do empreendimento a ser realizado a de aferição da capacidade técnica dos entes tomadores. Além disso, vislumbra-se encaminhamento de recomendação ao Ministério Economia para que busque incentivar a atuação de consórcios intermunicipais com a finalidade de diminuir a desigualdade técnica e profissional entre os municípios menos favorecidos.



A articulação e cooperação entre os Tribunais de Contas é requisito para viabilizar o acompanhamento tempestivo das obras, para induzir a correção de possíveis impropriedades, mitigar os riscos de novas paralisações, bem como contribuir para que as escolas, creches e quadras poliesportivas sejam concluídas com qualidade, preço e prazos adequados.

O Controle tem o desafio não apenas de fiscalizar a retomada das obras, como também de apoiar os municípios, que apresentam carência de profissionais e técnicos da área de engenharia, dando a sua parcela de contribuição na redução das desigualdades regionais e assegurando que os municípios carentes também consigam retomar e concluir as obras.



As obras, afinal de contas, não são um fim em si; mas um instrumento para potencializar a função estatal de cumprir com suas obrigações perante a sociedade.

Min. Valmir Campelo

OBRIGADA!

Keyla Boaventura

Auditora-Chefe da AudUrbana

Unidade de Auditoria Especializada em
Infraestrutura Urbana e Hídrica do TCU



"PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA"
